

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

č. j. 0836/2017/OI/1050

č. smlouvy zhotovitele OSM170028

Komunitní centrum Hloubětínská 55

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
Sídlo:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČO:	186 26 084
DIČ:	CZ186 26 084
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2326
Zastoupen:	Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) na hliníkové fasádě. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 - Cena díla

doplňuje se odstavce:

- 5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	2.309.614,72 Kč
DPH 21 %	485.019,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.794.633,81 Kč

Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

- 16.23 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 28. 5. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 339/RMČ/2018.
- 16.24 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
- 16.25 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0836/2017/OI/1050 ze dne 4. 12. 2017 a dod. č. 1 ze dne 31. 1. 2018 zůstávají v platnosti.

11. 06. 2018

V Praze dne:

V Praze dne: 11. 6. 2018

.....
starosta

.....
Ing. Miloš Smolík, jednatel

.....
Eva Smolíková, jednatelka

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 9

Změnový list č. 1		21.5.2018
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Komunitní centrum Hloubětínská 55	

Popis změny	Změna hliníkových výplní otvorů.
Specifikace změny	Změna zasklení výplní otvorů s ohledem na bezpečnost a statiku zasklení. Změna členění výplní otvorů s ohledem na statiku.
Zdůvodnění změny	Projektová dokumentace nerespektovala požadavky pro zasklívání výplní otvorů z hlediska statického a z hlediska bezpečnosti.

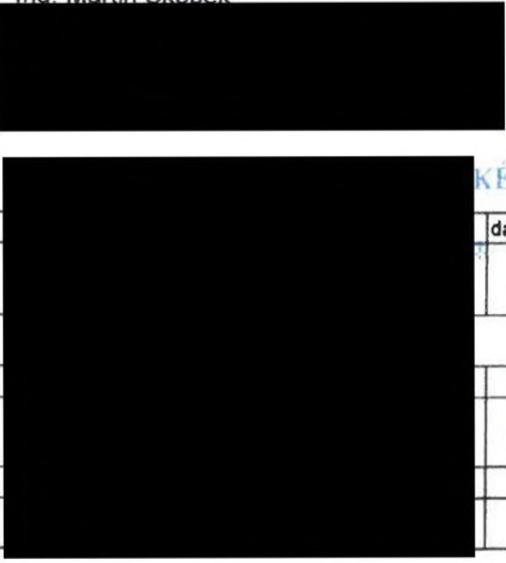
Vypracoval

EKIS, spol.s r.o.

Ing. Martin Škopek

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

jméno		datum
Ing. Miloš Smolík		21.5.2018
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. I. ZIGMUND		23.5.2018
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 1

Název stavby: Komunitní centrum Hloubětínská 55						Změnový list č. 1							
Částka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
97	546171241	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových rámů s výplní izolačním dvoisklem pl do 5 m2 (O2 2)	m2	2,93		369,00	1 080,80	2,93	369,00	1 080,80	0,00	0,00	0,00
98	186711719	dodávka fasádních výplní - dvoukřídlové dveře 146/200 6 cm vc povrchové úpravy kotěvních a spojovacích prvků tesnění a kování dle specifikace výkres č 700 701 (O2 2)	kus	1,00		69 300,00	69 300,00	1,00	73 092,84	73 092,84	0,00	3 792,84	3 792,84
99	546171244	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových rámů s výplní izolačním dvoisklem pl přes 15 m2 (O1 1 1 2 1 3 2 1 2 3)	m2	281,07		520,00	146 158,48	281,07	520,00	146 158,48	0,00	0,00	0,00
100	186711723	dodávka fasádních výplní vc povrchové úpravy kotěvních a spojovacích prvků tesnění a kování dle specifikace výkres č 700 701 (O1 1 1 2 1 3 2 1 2 3)	m2	281,07		8 996,64	2 528 722,00	281,07	14 505,43	4 077 099,19	0,00	5 508,79	1 548 377,19
227	767111120	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 100 kg (P0 01 P1 02)	m2	16,87		1 200,00	20 241,60	16,87	1 200,00	20 241,60	0,00	0,00	0,00
228	586112036	P 01 - prosklená akustická příčka v systémovém Al rámu 3250/2470mm se 4 otevíracími moduly vc povrchové úpravy a kování	kus	1,00		133 396,00	133 396,00	1,00	211 906,91	211 906,91	0,00	8 510,91	28 510,91
229	586112046	P 102 - prosklená příčka s bezpečnostním zasklením v systémovém Al rámu 3400/2600 mm s dvoukřídlovými dveřmi 900x450x2200 mm povrchové úpravy a kování	kus	1,00		56 969,98	56 969,98	1,00	72 154,31	72 154,31	0,00	15 184,33	15 184,33
257	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku (O 0 2)	kus	1,00		1 250,00	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
258	553412462	dveře hliníkové vchodové plně jednokřídlové 900 x 1980 mm vc zarubně kování a povrchové úpravy dle specifikace výkres č 700 701	kus	1,00		32 000,00	32 000,00	1,00	55 350,67	55 350,67	0,00	23 350,67	23 350,67
259	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku (O 0 1, 0 3)	kus	3,00		2 500,00	7 500,00	3,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
260	553413110	dveře hliníkové vchodové plně dvoukřídlové 1800 x 2150 mm vc zarubně povrchové úpravy a kování dle specifikace výkres č 700 701 (O 0 1)	kus	1,00		68 420,00	68 420,00	1,00	73 156,88	73 156,88	0,00	4 736,88	4 736,88
261	553413112	dveře hliníkové vchodové pevně dvoukřídlové 1975 x 2150 mm vc společném ramenci zarubně povrchové úpravy a kování dle specifikace výkres č 700 701 (O 0 3)	kus	2,00		72 540,00	145 080,00	2,00	390 370,95	780 741,90	0,00	317 630,95	635 661,90

	Cena díla bez DPH SoD	28 936 915,08	
	DPH 21%	6 076 752,17	
	Cena díla včetně DPH	35 013 667,25	
	Cena díla bez DPH ZBV1	31 246 529,80	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	6 561 771,26	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	37 808 301,06	Rozdíl včetně DPH
			2 309 614,72
			485 019,09
			2 794 633,81

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Schválil:

TDI

ING. F. EIGMUND

Projektant

Objednatel

Podpis

Datum

21.5.2018

Datum

23.5.2018

Datum

Datum
